



**MAT: APRUEBA AUMENTO DE PLAZO EN  
OBRA DE CONSTRUCCIÓN, QUE SE  
INDICA.**

---

ALGARROBO, 27 AGO 2014

DECRETO N° 3782

**VISTOS:**

1. D.F.L 1 fija texto refundido coordinado y sistematizado de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.
2. D.F.L-19.653 del 17.11.2001 fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de bases Generales de la Administración de Estado.
3. D.A N° 228-19.321 de fecha 16.09.94 (Aprobación planta Municipal).
4. Ley 19.886, Ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestaciones de servicio.
5. Acuerdo N° 162 Sesión Ordinaria N° 35 de fecha 04.12.2013.
6. D.A N° 4.031 de fecha 12.12.2013 aprueba acuerdo N° 162.
7. D.A N° 4.050 de fecha 13.12.2013 aprueba presupuesto Municipal año 2014.
8. D.A N° 1928 de fecha 24.04.2014, aprueba bases administrativas para la ejecución del proyecto denominado "Construcción sede deportiva y recreacional AFAMA".
9. D.A N° 2524 Adjudica Licitación Pública.
10. D.A N° 2909 de fecha 30.06.2014, Aprueba Contrato de "Construcción sede deportiva y recreacional AFAMA"
11. Solicitud de fecha 20 de agosto del 2014, de la Empresa Constructora San marcos Ltda.
12. Memorándum N° 127 de la Sra. Karin Paredes Vásquez, arquitecta de la Dirección de Obras Municipales.
13. Decreto Alcaldicio N° 728, de fecha 11.02.2014; Establece orden de Subrogancias de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo.

**CONSIDERANDO:**

- I. Que, mediante Decreto Alcaldicio N° 2909 de fecha 30.06.2014, se aprueba Contrato celebrado con fecha 25 de Junio del año en curso Licitación Pública denominada "Construcción sede deportiva y recreacional AFAMA"
- II. Que, mediante presentación de fecha 20 de agosto del 2014 enviada por don Carlos Pacheco de la constructora San Marcos Ltda., solicita a la Dirección de Obras Municipales aumento de plazo por 15 días corridos.
- III. Que, mediante Memorándum N° 127 de fecha 22.08.2014 la Sra. Karin Paredes, arquitecta de la Dirección e Obras Municipales, solicita a don Jaime Gálvez Fuenza, Alcalde de la I. Municipalidad de Algarrobo, aumento de plazo para la obra de "Construcción sede deportiva y recreacional AFAMA"
- IV. Que, visto y dispuesto lo establecido en las Bases Administrativas Generales de la presente licitación, en su punto 11.6 de los plazos para la ejecución de las obras, en su artículo 51° y siguiente: "En casos especiales y debidamente

fundados, podrá autorizarse modificaciones a los plazos estipulados para las etapas pactadas, siempre que signifiquen una conveniencia al interés superior de la Comuna.”

**DECRETO:**

- I. Aprueba aumento de plazo en Obra de Construcción denominada “Construcción sede deportiva y recreacional AFAMA”, por quince días corridos, desde el 30 de agosto del 2014 hasta el 13 de septiembre del 2014, ambas fechas inclusive.


**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, DISTRIBÚYASE Y ARCHÍVESE.**



**PAULINA MALDONADO PINTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL (S)**  
JGF/PMP/MRT/fch

**DISTRIBUCION:**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| ✓ SECPLAC            | (1) |
| ✓ DOM                | (1) |
| ✓ Dirección Jurídica | (1) |
| ✓ Archivo            | (2) |

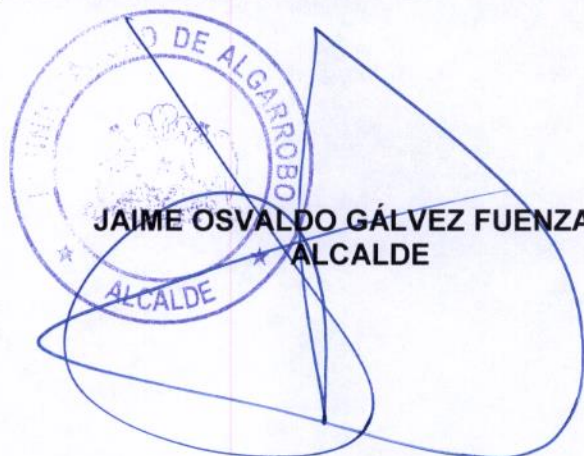

**JAIME OSVALDO GÁLVEZ FUENZA**  
**ALCALDE**

OBS. D.R. 050-14.

CONTROL INTERNO

|           |           |          |
|-----------|-----------|----------|
| RECEPCION | DOCUMENTO | N°       |
| FECHA     | 27        | AUG 2014 |
| SALIDA    | 27        | AUG 2014 |
| DOCUMENTO |           | N°       |
| FECHA     | 27        | AUG 2014 |
| NO. ASRE  | 27        | AUG 2014 |
